


質 疑 回 答 書

入善町長 笹島 春人
(公印省略)


工事名:入善町中央公園屋内多目的施設建設工事

質疑事項	回 答
1 設計図A-08 今回工事対照建物(井戸ポンプ庫・駐輪)の表記がありますが対象外と考えてよいですか(設計書無し)	別途工事とする。
2 設計書A-45 パークゴルフ用カップ(4ヶ所)の埋込詳細図の指示をお願いします	添付資料参照のこと。
3 設計図A-12 外部仕上表その他に誘導ブロックがありますが、設計書・図示がありません	別途工事とする。
4 設計図A-22・24・25・27・28 コーナーガード(既製品)木目調・木製コーナーガードH=1800(角共通)・木見切40×40角R面取りの2種類ありますがどちらでしょうか。木製の場合材質教えてください(設計書は木製表記)	40×40角面取り木製(杉)とする。 RC角は、H1,800mmとする。
5 設計図A-04・34 網戸ですが、特記仕様書(ガラス繊維入り合成樹脂)・建具表(ステンレス)で表記が違います。どちらでしょうか	ガラス繊維入り合成樹脂とする。
6 設計書A-4、設計図A-12・36 地業A・B・Cの砕石厚が図面で違います。(100mmと120mm)どちらでしょうか	100mmとする。
7 設計図A-24・25 犬走りのカッター目地幅、深さを教えてください。またその他の土間スラブはカッター目地無しと考えてよいですか	幅6mm深さ30mm程度とする。 その他の土間スラブにカッター目地は不要とする。
8 設計図A-03 建て方時の鉄骨を受ける内部枠組仕上足場の補強は必要ですか。必要な場合は範囲及び仕様を教えてください	必要とする。 (トラス下弦ジョイント部(8ヶ所程度)に支保工の設置)範囲等は、受注後に協議とする。
9 現状アスファルト舗装の撤去は本工事に含まれますか	別途工事とする。
10 安全祈願祭費用の計上は必要ですか	受注業者において行うものとする。
11 設計書A-3、設計図S-18 異形鋼材の数量不足では? ガス圧接ヶ所の数量不足では? スラブリストのDS10の差し筋必要では?	参考数量とする。 不足ある場合は、受注後に協議の対象とする。 DS10に差し筋は不要とする。
12 設計図A-08 ⑩新設の屋内多目的施設の既存駐車場のアスファルト舗装等の撤去工事は今回の工事に含んでいますか?	質疑9回答を参照のこと。

質疑事項	回 答
13 設計図A-12 外部仕上げ、その他に誘導ブロック:タイル300角有り。 場所を指示ください。	質疑3回答を参照のこと。
14 設計書A17-4体育器具工事の中に防球ネット受け材が 含まれていません。	鉄骨工事及びシャッター工事に含む。
15 設計図A-20 X5通り付近のこどもの国と屋内多目的室の床、人工芝 t12とt30の段差の処理の仕方の指示をお願いします。 (土間コンクリートで段差?床見切金物ですか?)	見切材は不要とする。 土間コンクリートで段差を処理すること。
16 設計図A-22、A-26、A-27、A-38 A-22:休憩コーナーベンチ、1カ所 A-26:X5～X6間、X12～X13にベンチ、2カ所 A-27:X5～X6間、X12～X13にベンチ、2カ所 A-38:休憩コーナーベンチ、1カ所 休憩コーナーの1カ所でよろしいですね	ベンチは1カ所とする。
17 設計図A-43 防球ネット用受材(B部詳細)φ60.5*3.2とあります。 (鉄骨への取付方法の指示をお願いします)32カ所? 防球ネット用受材(シャッター部)外形φ42、線径φ9.5 (シャッターBOXへの取付方法の指示をお願いします)7カ所 それぞれの数量の指示もお願いします。	防球ネット用受材φ60.5*3.2は、36カ所とする。 A-44あ上部を参照のこと。 防球ネット用受材(シャッター部)外形φ42、線径φ9.5 は14カ所とする。 シャッターボックス内の下地に溶接とする。
18 設計書A-40 床ポイント(人工芝色分け)と明記ありますが何色程度で しょうか。	3色とする。
19 間仕切りカーテンは、天井直付けでしょうか。	壁付けとする。
20 間仕切りカーテンは、1.5倍程度の遮光カーテンでよろし いでしょうか。	よろしい。
21 設計書A-9～11、設計図S-21、設計書A-3 施工費摘要欄:重機費別途⇒地場で組立時に5tクレー ン(1.0ヶ月)必要・建方時に50tクレーン(2.5ヶ月)必要で は? 現場塗装費:立体トラス接合部詳細図の現場塗装の際 の足場が設計書A-3の直接仮設工事の内訳明細に無 し。 建方時における必要支保工(四角支柱)内訳明細書無 し。 専用足場:鉄筋・コンクリート足場無し。	施工方法に応じた必要数量を見込むこと。 支保工は8カ所程度を見込むこと。(質疑8回答参照)
22 設計図A-41 防炎ネット:防炎・非防炎の記載なし 工事期間中の建物外周部は、他の工事と関連はありま すか?	防炎とする。 他の工事と調整の上、工事を進めること。

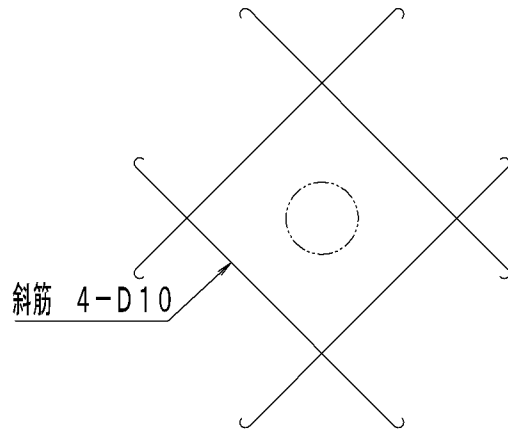

土間コンクリート補強図



パークゴルフ用カップ詳細図

S=1/20
